



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría de planeación y evaluación
Dirección General de Inversión pública
FONDEREG 2018

ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: 03
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2018

REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO

LOCALIDAD

CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO -												
LOS DOLORES KM 1+530 A 3+240 KM CON UNA CORONA DE 7.00 MTS DE ANCHO CONSISTIENDO EN EL												
TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASES HIDRÁULICAS, SELLOS DE LIGA Y												
PAVIMENTO ASFALTICO.												

Fecha de Inicio: 22-may-18

Fecha de Terminación Real:

Metas Proyectadas: 580.04 M2

Metas Alcanzadas:

Beneficiarios Directos: 150

Beneficiarios Indirectos: 200,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%												0%
Financiero	0%												0%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO:

DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

Situación de la Obra: No Iniciada (X) Terminada sin Operar: ()
En Proceso () Terminada y Operando: ()
Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre: ARO. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 15 de MAYO de 2018



SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION 03

PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA ACCION:

REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87

ANTES

INICIO



PROCESO

FINAL

GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No.03

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre: ARQ. DIEGO RADILLA SANCHEZ

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 15 de MAYO de 2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría de planeación y evaluación
Dirección General de Inversión pública
FONDEREG 2018

ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: 03

PROGRAMA: FONDEREG

EJERCICIO: 2018

REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO -
LOS DOLORES KM 1+530 A 3+240 KM CON UNA CORONA DE 7.00 MTS DE ANCHO CONSISTIENDO EN EL
TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASES HIDRÁULICAS, SELLOS DE LIGA Y
PAVIMENTO ASFALTICO.

Fecha de Inicio: 22-may-18

Fecha de Terminación Real:

Metas Proyectadas: 580.04 M2

Metas Alcanzadas:

Beneficiarios Directos: 150

Beneficiarios Indirectos: 200,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%	0%	40%										40%
Financiero	0%	0%	22%										22%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO: TRAZO Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE ÁREAS DESCUBIERTAS, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL,
SUMINISTRO Y MATERIAL SUB-BASE, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO DE AVANCE FINANCIERO: PAGO 1RA. ESTIMACIÓN \$773,236.58

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso (X) Terminada y Operando: ()
Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Nombre: ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES

Cargo: Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 15 de JUNIO de 2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018


REGION 03

CEDULA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE CAPITAL

PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES
2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD: SAN IGNACIO CERRO GORDO
NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES
2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MONTO ASIGNADO:



ANTES

INICIO

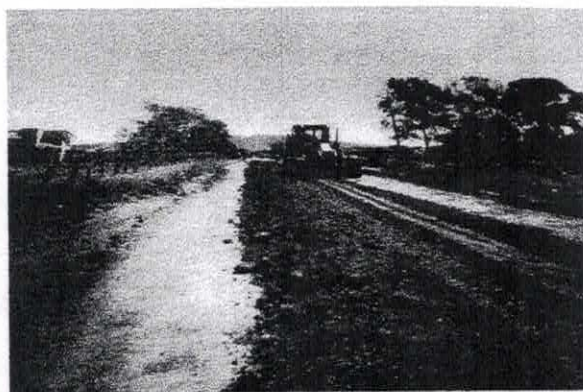

PROCESO

FINAL



GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No.03

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre: ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 15 de JUNIO de 2018



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: 03

PROGRAMA: FONDEREG

EJERCICIO: 2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO -

LOS DOLORES KM 1+530 A 3+240 KM CON UNA CORONA DE 7.00 MTS DE ANCHO CONSISTIENDO EN EL
TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASES HIDRÁULICAS, SELLOS DE LIGA Y
PAVIMENTO ASFALTICO.

Fecha de Inicio: 22-may-18

Fecha de Termino Real:

Metas Proyectadas: 580.04 M2

Metas Alcanzadas:

Beneficiarios Directos: 150

Beneficiarios Indirectos: 200,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Fisico	0%	0%	40%	10%	10%	10%							70%
Financiero	0%	0%	22%	12%	18%	18%							70%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO: TRAZO Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE AREAS DESCUBIERTAS, MEJORAMIENTO DE
TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y MATERIAL SUB-BASE, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURADE BALIZAMIENTO EN CARRETERA PARA LÍMITE DE CARRIL

DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO: PAGO DEL 25% DE ANTICIPO Y PAGO POR
1RA. ESTIMACIÓN, 2DA. ESTIMACIÓN Y 3RA. ESTIMACIÓN

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso (X) Terminada y Operando: ()
Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Nombre: ING.-ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 16 de AGOSTO de 2018

SUB SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION 03

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018 REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA
NOMBRE DEL PROYECTO: ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD: SAN IGNACIO CERRO GORDO
NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87



ANTES

INICIO



PROCESO

FINAL

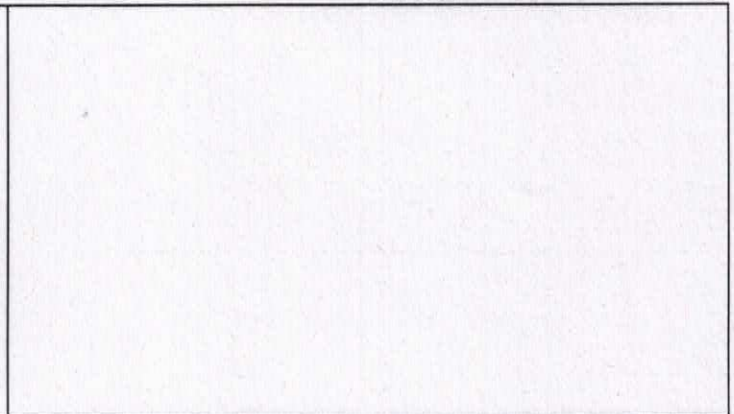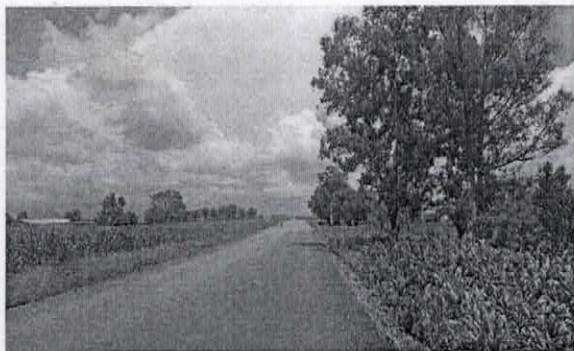

GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No.03

GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Nombre: ING. ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 16 de AGOSTO de 2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría de planeación y evaluación
Dirección General de Inversión pública
FONDEREG 2018

ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: 03
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2018

REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN IGNACIO -													
LOS DOLORES KM 1+530 A 3+240 KM CON UNA CORONA DE 7.00 MTS DE ANCHO CONSISTIENDO EN EL													
TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASES HIDRÁULICAS, SELLOS DE LIGA Y													
PAVIMENTO ASFALTICO.													

Fecha de Inicio: 22-may-18
Metas Proyectadas: 580.04 M2
Beneficiarios Directos: 150

Fecha de Terminación Real: 31 de octubre
Metas Alcanzadas: 580.14
Beneficiarios Indirectos: 200,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%	0%	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
Financiero	0%	0%	22%	12%	18%	18%	10%	15%	15%				100%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO: TRAZO Y NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE ÁREAS DESCUBIERTAS, MEJORAMIENTO DE
TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y MATERIAL SUB-BASE, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA,
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE BALIZAMIENTO EN CARRETERA PARA LÍMITE DE CARRIL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO DE AVANCE FINANCIERO: PAGO DEL 25% DE ANTICIPO Y PAGO POR
1RA. ESTIMACIÓN, 2DA. ESTIMACIÓN, 3RA. ESTIMACIÓN, 4TA. ESTIMACIÓN, 5TA ESTIMACIÓN Y PAGO DE FINIQUITO

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso () Terminada y Operando: (X)
Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Nombre: ING.-ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ

Cargo: Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 31 de OCTUBRE de 2018



SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018


REGION 03

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MUNICIPIO: SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD: SAN IGNACIO CERRO GORDO
NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE CARRETERA SAN IGNACIO-LOS DOLORES 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
MONTO ASIGNADO: \$3'448,275.87


ANTES

INICIO

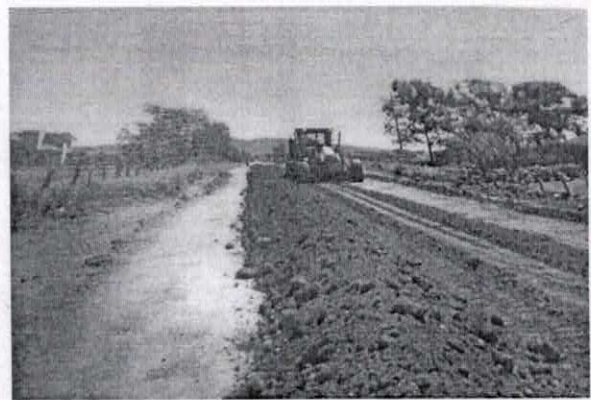

PROCESO

FINAL

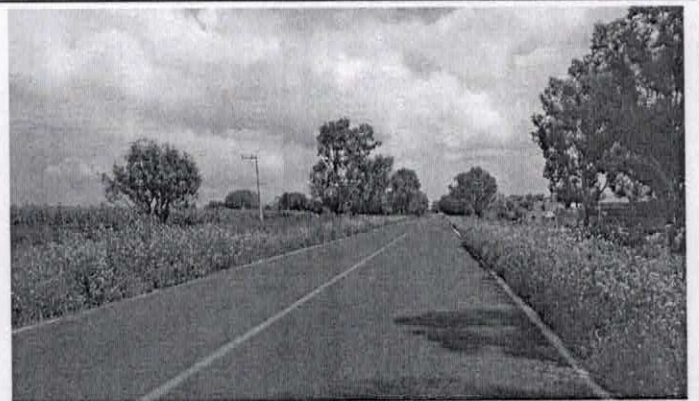

GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No.03

GOBIERNO MUNICIPAL

Ing. Angel Guillermo López Dueñas
Coordinador Regional

Nombre: ING.-ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 31 de OCTUBRE de 2018
